Tunnus	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis
1	**Hankesuunnittelu**	**ti 28.1.2025**	**to 8.5.2025**
2	Hankesuunnitelman laadinta	ti 28.1.2025	ti 29.4.2025
3	Valtuuston kokous, investointipäätös	to 8.5.2025	to 8.5.2025
4	**Suunnittelun kilpailutus**	**ma 19.5.2025**	**ke 13.8.2025**
5	**Suunnitteluvaihe**	**ma 15.9.2025**	**pe 30.1.2026**
6	Suunnittelun aloitus ja alustavat luonnokset	ma 8.9.2025	ti 23.9.2025
7	Tarkennettu luonnos	ke 24.9.2025	ti 14.10.2025
8	Tekninen luonnossuunnittelu	ke 15.10.2025	ti 4.11.2025
9	Tekninen suunnittelu	ke 5.11.2025	ti 2.12.2025
10	Piha-alueen työpaja	to 20.11.2025	to 20.11.2025
11	Piha-alueen suunnittelu	ma 24.11.2025	ti 13.1.2026
12	Urakkalaskentasuunnitelmat	ke 3.12.2025	ma 12.1.2026
13	Urakkalaskenta-asiakirjojen viimeistely	ke 14.1.2026	ti 3.2.2026
14	Viranomaisneuvottelut	ke 3.12.2025	pe 23.1.2026
15	Rakennuslupahakemus	ke 31.12.2025	pe 27.2.2026
16	Kustannusarvion laadinta	ma 26.1.2026	pe 30.1.2026
17	**Kaupallisten laskenta-asiakirjojen laadinta**	**ma 12.1.2026**	**ti 3.2.2026**
18	**Urakkalaskenta kokonaisurakka**	**ke 4.2.2026**	**pe 27.3.2026**
19	**Hankintapäätös ja urakkasopimus**	**ma 30.3.2026**	**to 30.4.2026**
20	**Kunnanhallituksen kokous**	**ma 7.4.2025**	**ma 7.4.2025**
21	**Valmistelevat työt kunnallistekniikan muutokset (Tilaaja)**	**ma 1.6.2026**	**pe 17.7.2026**
22	**Toteutusvaihe 1 muutos- ja purkutyöt**	**ma 1.6.2026**	**pe 30.10.2026**
23	Työmaan perustaminen ja valmistelut	ma 1.6.2026	ke 3.6.2026
24	Muutos 1 alueen purkutyöt	to 4.6.2026	ke 24.6.2026
25	Suojaseinät	to 4.6.2026	pe 12.6.2026
26	Tekniikan muutokset	ma 8.6.2026	pe 31.7.2026
27	LJH rakennustyöt	ke 17.6.2026	pe 10.7.2026
28	LJH tekniikan rakentaminen	ma 13.7.2026	pe 14.8.2026
29	LJH tekniikan kytkennät	la 15.8.2026	su 16.8.2026
30	Tietoliikennekeskuksen siirto	ma 8.6.2026	pe 17.7.2026
31	Haitta-ainepurkutyöt	to 4.6.2026	pe 28.8.2026
32	Purkutyöt	ma 17.8.2026	pe 30.10.2026
33	**Toteutusvaihe 2 muutos- ja laajennustyöt**	**ma 12.10.2026**	**pe 3.9.2027**

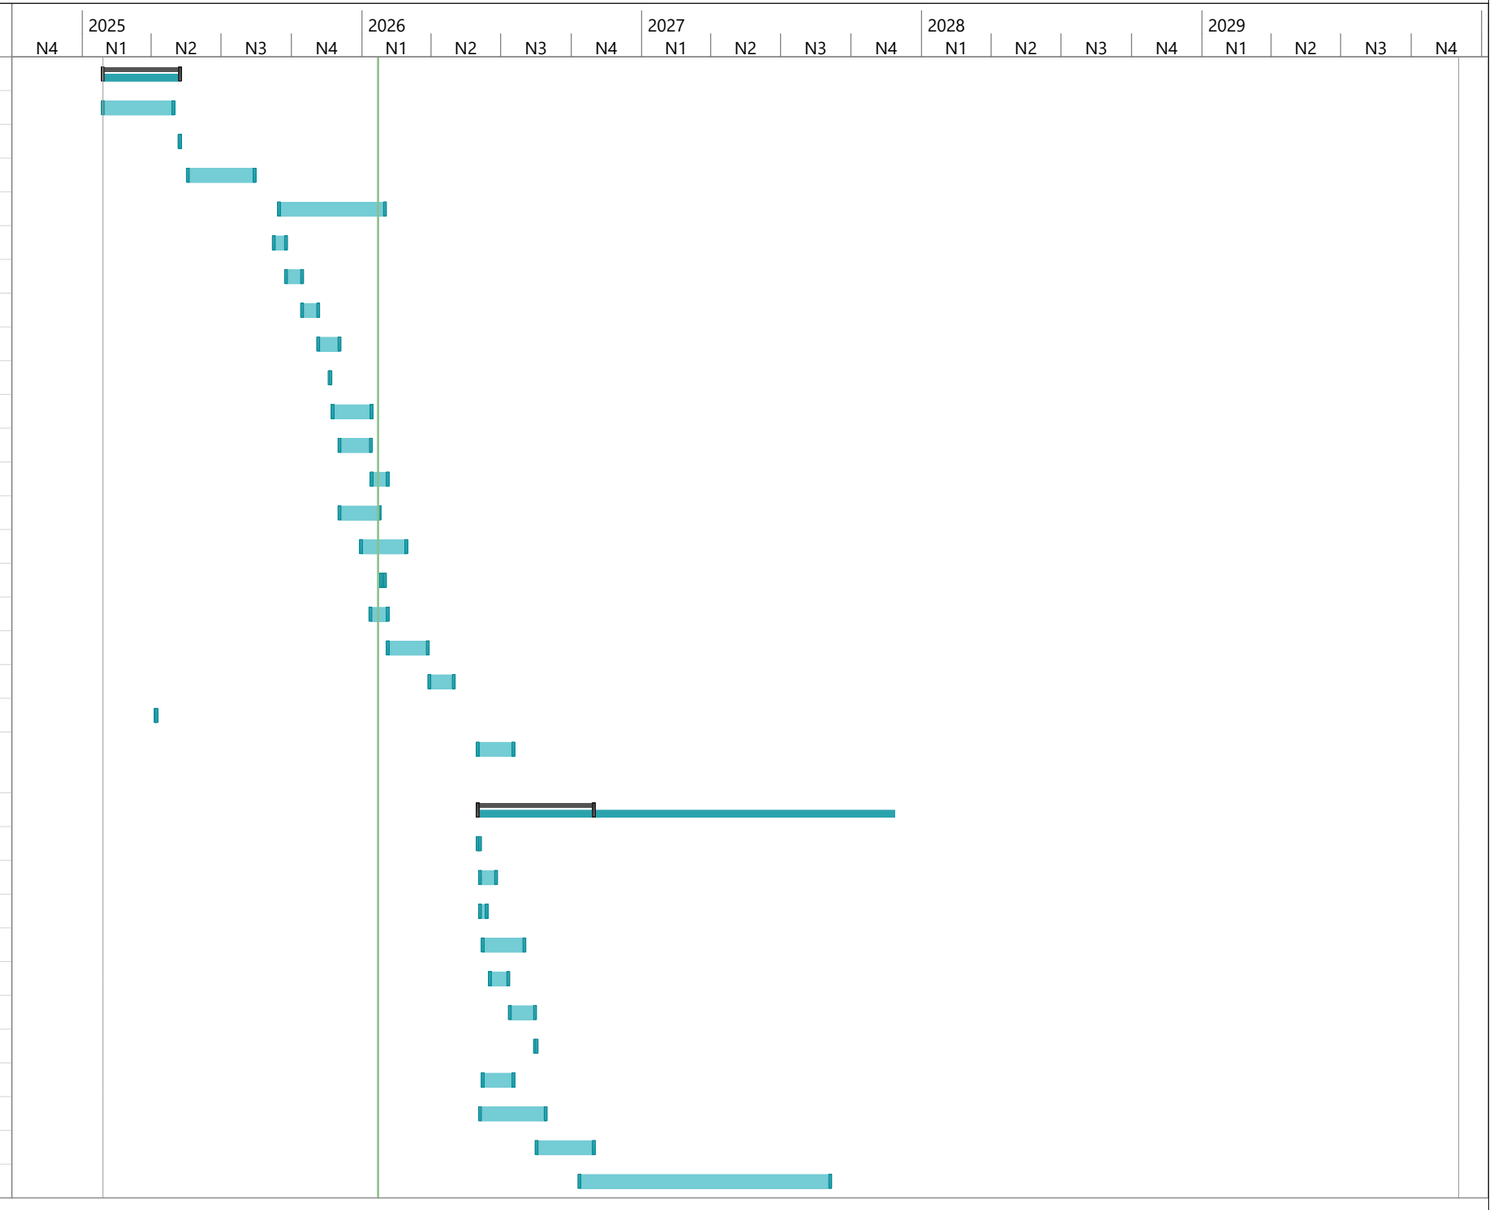

Projekti: Utajärvi, koulu
Aihe: Alustava projektiaikataulu
Päivämäärä: to 22.1.2026

Tehtävä
Jako
Välitavoite
Yhteenveto
Projektin yhteenveto
Passiivinen tehtävä
Passiivinen välitavoite
Passiivinen yhteenveto
Manuaalinen tehtävä
Vain kesto
Manuaalinen yhteenvetokokoelma
Manuaalinen yhteenveto
Vain aloitus
Vain valmistumispäivä
Ulkoiset tehtävät
Ulkoinen välitavoite
Tavoiteaika
Tilanne
Manuaalinen edistyminen

Tunnus	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis
34	Muutos 1 (peruskorjattava alue) ja laajennus 1 (VSS ja oheistilat)	ma 12.10.2026	pe 26.11.2027
35	Laajennus 1 maanrakennustyöt	ma 19.10.2026	pe 13.11.2026
36	Uudisrakennus 1 ja 2	ma 7.6.2027	pe 30.7.2027
37	Laajennus 2 ja 3	ma 7.6.2027	pe 30.7.2027
38	Piha-alueen muutokset	ma 3.5.2027	pe 3.9.2027
39	**Vastaanotto**	**ke 1.12.2027**	**ke 1.12.2027**
40	**Käyttöönotto**	**ke 1.12.2027**	**pe 7.1.2028**
41	**Pihatöiden viimeistely**	**ma 5.6.2028**	**pe 30.6.2028**
42	**Takuuvaihe 24 kk**	**ke 1.12.2027**	**la 1.12.2029**
43			
44			
45			

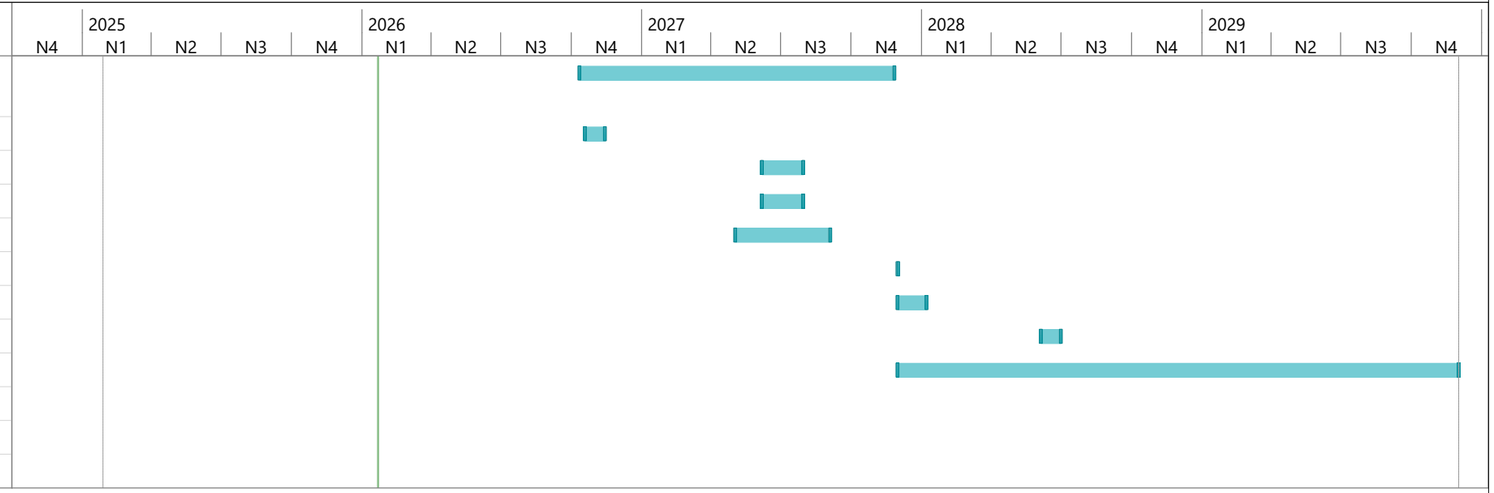

Projekti: Utajärvi, koulu
Aihe: Alustava projektiaikataulu
Päivämäärä: to 22.1.2026

Tehtävä	Passiivinen tehtävä	Manuaalinen yhteenvetokokoelma	Ulkoinen välitavoite		
Jako	Passiivinen välitavoite	Manuaalinen yhteenveto	Tavoiteaika		
Välitavoite	Passiivinen yhteenveto	Vain aloitus	Tilanne		
Yhteenveto	Manuaalinen tehtävä	Vain valmistumispäivä	Manuaalinen edistyminen		
Projektin yhteenveto	Vain kesto	Ulkoiset tehtävät			
